

HOTARARE

privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Amenajare trotuare în comuna Straja, județul Suceava, de la Cîrciu Dimitrie (Ionașcu – nr. 899) până la Cîrciu Ilie (Jelea – nr. 943)", ca urmare a executării unor lucrări suplimentare

Consiliul Local al comunei Straja, județul Suceava,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Mihai Juravle, primarul comunei Straja, înregistrat sub nr. 4.769 din 11.06.2025;
- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar - contabil al Primăriei comunei Straja, înregistrat sub nr.
- Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico - socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și turism, înregistrat sub nr.
- Hotărârea Consiliului Local Straja nr. 38/20.12.2021 privind aprobarea documentației tehnico - economice - fază Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare trotuare în comuna Straja, județul Suceava, de la Cîrciu Dimitrie (Ionașcu – nr. 899) până la Cîrciu Ilie (Jelea – nr. 943)".
- Hotărârea Consiliului Local Straja nr. 61/28.11.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aprobați prin Hotărârea nr. 38 din 20.12.2021 pentru obiectivul de investiții "Amenajare trotuare în comuna Straja, județul Suceava, de la Cîrciu Dimitrie (Ionașcu – nr. 899) până la Cîrciu Ilie (Jelea – nr. 943)".
- Contractul de lucrări încheiat cu S.C. LODOR CONSTRUCT SRL;
- Nota de constatare nr. 1 înregistrată la Primăria comunei Straja sub nr. 2668 din 26.03.2025, însoțită de memoriu tehnic nr. 1 întocmit de proiectant S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. și dispoziția de șantier nr. 1 la proiectul nr. 3/2021 privind lucrările suplimentare necesare de executat în cadrul obiectivului de investiții;
- Centralizatorul financiar NR, NC și NCS, precum și Devizul general întocmit de proiectant S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L., atât pentru lucrările suplimentare cuprinse în Dispoziția de șantier nr. 1, cât și pentru valoarea finală a investiției, înregistrat la Primăria comunei Straja sub nr. 4763 din 11.06.2025;
- Dispozițiile art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadrului al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- În conformitate cu dispozițiile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. b) și alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1) și (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă executarea lucrărilor suplimentare cuprinse în Dispoziția de șantier nr. 1 la obiectivul de investiții "Amenajare trotuare în comuna Straja, județul Suceava, de la Cîrciu Dimitrie (Ionașcu – nr. 899) până la Cîrciu Ilie (Jelea – nr. 943)", cu finanțare din fonduri de la bugetul local al Comunei Straja, ca urmare a lucrărilor suplimentare ce se execută, cu o valoare finală a investiției de 787.418,865 lei (fără TVA), din care C+M 698.534,980 lei, 935.473,511 lei (cu TVA), din care C+M 831.256,626 lei, conform Devizului general prevăzut în Anexa nr. 2.
- Art.2.** Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Amenajare trotuare în comuna Straja, județul Suceava, de la Cîrciu Dimitrie (Ionașcu – nr. 899) până la Cîrciu Ilie (Jelea – nr. 943)", cu o valoare finală a investiției de 787.418,865 lei (fără TVA), din care C+M 698.534,980 lei, 935.473,511 lei (cu TVA).
- Art.3.** Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.4.** Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
- Art.5.** Primarul comunei Straja, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.
- Art.6.** Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefecturală a Județului Suceava, Primarul comunei Straja, Compartimentul financiar - contabil din cadrul www.primariastraja.ro.



Straja nr.
12-06-2025
23/2025

Ca urmare a Notei de constatare nr. 1 din 26.03.2025 prin care s-a constatat necesitatea operării unor modificări la obiectivul de investiție „Amenajare trotuare în comuna Straja, județul Suceava, de la Cărciu Dimitrie (Ionascu-nr.899), până la Cărciu Ilie (Jelea-nr.943)” pentru a se asigura funcționalitatea, stabilitatea și siguranța în exploatare a proiectului, se dispun următoarele:

1. Pentru a asigura o rezistență sporită a trotuarului în zonele prin care se face alimentarea cu marfă a depozitelor din zona „La Troaca” s-a propus utilizarea a 701mp pava cu grosime 8cm, astfel s-a renunțat la 513mp pava cu grosimea de 6cm,
2. Pentru a reconfigurarea spațiului public s-a propus executia unui spatiu de joaca prevazut cu echipamente de joaca, gazon sintetic, 4 stalpi pentru a asigura iluminatul iar pentru protectie a fost construita o imprejmuire cu sipci din lemn,
3. Pentru a proteja zona pietonala din zona „La Troaca” s-a dispus utilizarea a 543ml bordura din beton cu inaltimea de 25cm, astfel s-a renunțat la 1116 ml bordura mica 10x15,
4. Pentru a asigura o captare eficienta a apelor pluviale s-a propus folosirea a 23ml rigola carosabila cu capac, 336ml teava corugat si 10 geigere cu gratar impreuna cu 10 camine de vizitare,
5. S-a propus modernizarea fantanii care capteaza izvorul cu apa potabila,
6. A fost necesara ridicarea a in cota a 69 de capace provenite de la canalizarea existenta,
7. Pentru a spori rezistenta punții pietonale au fost inlocuite materialele lemnoase cu materiale metalice,

Executantul va adapta oferta conform Listelor de cantități – Note de renunțare anexate la prezenta.

Cu toate că modificările stabilite prin prezenta Dispoziție de șantier se încadrează în categoria modificărilor nesubstanțiale, totuși vor fi afectate indicatorii tehnico-economici, drept urmare se va modifica valoarea finală a investiției, iar devizul general va fi actualizat.

Predat:


BENEFICIAR :

Primaria Straja

- dl. Jurav

Diriginte Santier

- ing.

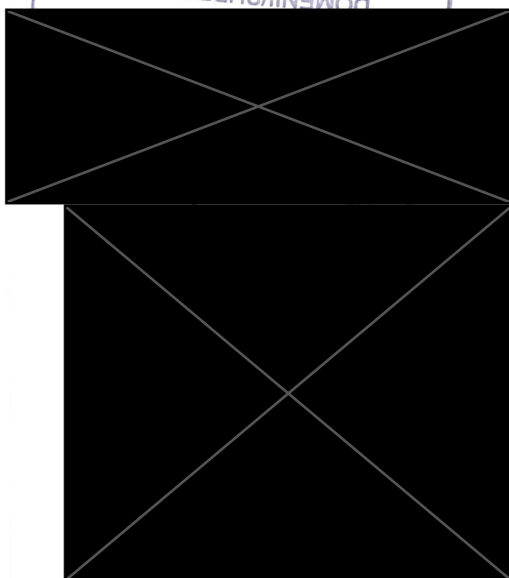


DOMENII/SUBDOMENII:
3.3: 6.1

PROIECTANT: S.C. NOVA PROIECT S.R.L. - ing. Cristea Gheorghe Dumitru



CONSTRUCTOR: LODOAR CONSTRUCT SRL - dl. Mironescu Dorin



OBIECTIV: AMENAJARE TROTUARE IN COMUNA STRAJA, JUD. SUCEAVA, DE LA CIRCIU DIMITRIE (IONASCU-NR.899) PANA LA CIRCIU ILIE(JELE, NR.943)



BENEFICIAR: COMUNA STRAJA

CENTRALIZATORUL FINANCIAR NR, NC, NCS

Nr. crt.	Obiecte / categorii de lucrari	VALOARE OFERTA	INCASAT ANTERIOR S1+S2	NOTA DE RENUNTARE	NOTA DE COMANDA	NOTA DE COMANDA SUPLEMENTARA	REST DE DECONTAT FINAL DUPA DS1
		Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei
1	Obiectul 1	581.897,44	199.530,89	252.448,22	252.448,22	116.637,54	499.004,09
2	Pavaj	450.880,02	199.530,89	125.945,20	252.448,22	116.637,54	494.489,69
3	Podete	66.166,55	0,00	66.166,55	0,00	0,00	0,00
4	Rigola carosabila	20.414,87	0,00	20.414,87	0,00	0,00	0,00
5	Punte pietonala	44.436,00	0,00	39.921,60	0,00	0,00	4.514,40
6	TOTAL	581.897,44	199.530,89	252.448,22	252.448,22	116.637,54	499.004,09
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :		581.897,44	199.530,89	252.448,22	369.085,76		499.004,09
Taxa pe valoarea adaugata		110.560,51	37.910,87	47.965,16	70.126,29		94.810,78
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :		692.457,95	237.441,76	300.413,38	439.212,05		593.814,87

EX
SC

BENEFICIAR



Formular F3

OBIECTIV: 96 AMENAJARE TROT IN COM. STRAJA, JUD. SUCEAVA, DE LA CIRCUIT DIMITRIE (GONASCU-NR.899) PANA LA CIRCUIT ILIE(JELEA-NR.943)

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectiv: 01 I EXECUTIE TROTARE

Categoria de lucrari: 01 I PAVAJ

Nota de renuntare: 01 NR 01

Executant: LODO

Obiectiv: 96

Obiectiv: 01

Categoria: 01

NR01

ron |

U. M.	Cantitatea	Preț unitar	Valoare
Capitolul de lucrari	Simbol	Denumire resursa	Observatii
0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	11
12	13	14	15
16	17	18	19
20	21	22	23
24	25	26	27
28	29	30	31
32	33	34	35
36	37	38	39
40	41	42	43
44	45	46	47
48	49	50	51
52	53	54	55
56	57	58	59
60	61	62	63
64	65	66	67
68	69	70	71
72	73	74	75
76	77	78	79
80	81	82	83
84	85	86	87
88	89	90	91
92	93	94	95
96	97	98	99
100	101	102	103
104	105	106	107
108	109	110	111
112	113	114	115
116	117	118	119
120	121	122	123
124	125	126	127
128	129	130	131
132	133	134	135
136	137	138	139
140	141	142	143
144	145	146	147
148	149	150	151
152	153	154	155
156	157	158	159
160	161	162	163
164	165	166	167
168	169	170	171
172	173	174	175
176	177	178	179
180	181	182	183
184	185	186	187
188	189	190	191
192	193	194	195
196	197	198	199
200	201	202	203
204	205	206	207
208	209	210	211
212	213	214	215
216	217	218	219
220	221	222	223
224	225	226	227
228	229	230	231
232	233	234	235
236	237	238	239
240	241	242	243
244	245	246	247
248	249	250	251
252	253	254	255
256	257	258	259
260	261	262	263
264	265	266	267
268	269	270	271
272	273	274	275
276	277	278	279
280	281	282	283
284	285	286	287
288	289	290	291
292	293	294	295
296	297	298	299
300	301	302	303
304	305	306	307
308	309	310	311
312	313	314	315
316	317	318	319
320	321	322	323
324	325	326	327
328	329	330	331
332	333	334	335
336	337	338	339
340	341	342	343
344	345	346	347
348	349	350	351
352	353	354	355
356	357	358	359
360	361	362	363
364	365	366	367
368	369	370	371
372	373	374	375
376	377	378	379
380	381	382	383
384	385	386	387
388	389	390	391
392	393	394	395
396	397	398	399
400	401	402	403
404	405	406	407
408	409	410	411
412	413	414	415
416	417	418	419
420	421	422	423
424	425	426	427
428	429	430	431
432	433	434	435
436	437	438	439
440	441	442	443
444	445	446	447
448	449	450	451
452	453	454	455
456	457	458	459
460	461	462	463
464	465	466	467
468	469	470	471
472	473	474	475
476	477	478	479
480	481	482	483
484	485	486	487
488	489	490	491
492	493	494	495
496	497	498	499
500	501	502	503
504	505	506	507
508	509	510	511
512	513	514	515
516	517	518	519
520	521	522	523
524	525	526	527
528	529	530	531
532	533	534	535
536	537	538	539
540	541	542	543
544	545	546	547
548	549	550	551
552	553	554	555
556	557	558	559
560	561	562	563
564	565	566	567
568	569	570	571
572	573	574	575
576	577	578	579
580	581	582	583
584	585	586	587
588	589	590	591
592	593	594	595
596	597	598	599
600	601	602	603
604	605	606	607
608	609	610	611
612	613	614	615
616	617	618	619
620	621	622	623
624	625	626	627
628	629	630	631
632	633	634	635
636	637	638	639
640	641	642	643
644	645	646	647
648	649	650	651
652	653	654	655
656	657	658	659
660	661	662	663
664	665	666	667
668	669	670	671
672	673	674	675
676	677	678	679
680	681	682	683
684	685	686	687
688	689	690	691
692	693	694	695
696	697	698	699
700	701	702	703
704	705	706	707
708	709	710	711
712	713	714	715
716	717	718	719
720	721	722	723
724	725	726	727
728	729	730	731
732	733	734	735
736	737	738	739
740	741	742	743
744	745	746	747
748	749	750	751
752	753	754	755
756	757	758	759
760	761	762	763
764	765	766	767
768	769	770	771
772	773	774	775
776	777	778	779
780	781	782	783
784	785	786	787
788	789	790	791
792	793	794	795
796	797	798	799
800	801	802	803
804	805	806	807
808	809	810	811
812	813	814	815
816	817	818	819
820	821	822	823
824	825	826	827
828	829	830	831
832	833	834	835
836	837	838	839
840	841	842	843
844	845	846	847
848	849	850	851
852	853	854	855
856	857	858	859
860	861	862	863
864	865	866	867
868	869	870	871
872	873	874	875
876	877	878	879
880	881	882	883
884	885	886	887
888	889	890	891
892	893	894	895
896	897	898	899
900	901	902	903
904	905	906	907
908	909	910	911
912	913	914	915
916	917	918	919
920	921	922	923
924	925	926	927
928	929	930	931
932	933	934	935
936	937	938	939
940	941	942	943
944	945	946	947
948	949	950	951
952	953	954	955
956	957	958	959
960	961	962	963
964	965	966	967
968	969	970	971
972	973	974	975
976	977	978	979
980	981	982	983
984	985	986	987
988	989	990	991
992	993	994	995
996	997	998	999
1000	1001	1002	1003
1004	1005	1006	1007
1008	1009	1010	1011
1012	1013	1014	1015
1016	1017	1018	1019
1020	1021	1022	1023
1024	1025	1026	1027
1028	1029	1030	1031
1032	1033	1034	1035
1036	1037	1038	1039
1040	1041	1042	1043
1044	1045	1046	1047
1048	1049	1050	1051
1052	1053	1054	1055
1056	1057	1058	1059
1060	1061	1062	1063
1064	1065	1066	1067
1068	1069	1070	1071
1072	1073	1074	1075
1076	1077	1078	1079
1080	1081	1082	1083
1084	1085	1086	1087
1088	1089	1090	1091
1092	1093	1094	1095
1096	1097	1098	1099
1100	1101	1102	1103
1104	1105	1106	1107
1108	1109	1110	1111
1112	1113	1114	1115
1116	1117	1118	1119
1120	1121	1122	1123
1124	1125	1126	1127
1128	1129	1130	1131
1132	1133	1134	1135
1136	1137	1138	1139
1140	1141	1142	1143
1144	1145	1146	1147
1148	1149	1150	1151
1152	1153	1154	1155
1156	1157	1158	1159
1160	1161	1162	1163
1164	1165	1166	1167
1168	1169	1170	1171
1172	1173	1174	1175
1176	1177	1178	1179
1180	1181	1182	1183
1184	1185	1186	1187
1188	1189	1190	1191
1192	1193	1194	1195
1196	1197	1198	1199
1200	1201	1202	1203
1204	1205	1206	1207
1208	1209	1210	1211
1212	1213	1214	1215

0	1	2	3	4	5
19	9000005	TONE	22,06600	455,00	10040,03
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				455,00	10040,03
20	DB02D1	82 SUTE MP	1,50000	295,93	443,90
				43,00	64,50
				5,41	8,11
				0,00	0,00
				344,34	516,50
21	DB16D1	82 MP	150,00000	0,06	9,08
				2,49	374,20
				1,48	222,30
				0,00	0,00
				4,04	605,57
21	9000006	TONE	14,10000	470,00	6627,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				470,00	6627,00
22	7802147	TONE	0,45000	6500,00	2925,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6500,00	2925,00
22	TRA06A20	82 TONE	82,31200	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				8,34	686,48
				8,34	686,48
23	TRA01A30	82 TONE	1026,24000	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				8,34	8558,84
				8,34	8558,84
Cheltuieli directe			92.157,90	17.033,72	119.496,05
Cheltuieli indirecte				1.059,10	9.245,32
Contrib. asig. munca			2,2500%		383,26
TOTAL CHELT. DIRECTE			92.157,90	17.416,98	119.879,31
Cheltuieli indirecte				1.059,10	9.245,32
Io = 3,0000% x To					3.596,38
Profit			Po = 2,0000% x (To+Io)		2.469,51
TOTAL GENERAL nota renuntare Vo = To+Io+Po					125.945,20

R CU AUTOBASCUANTIA PE DIST. = 30 KM.
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALULOR, SEMIFABRICATELO

BETONIERA DE 5,5MC DIST. = 20KM
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE LENTA S8877

MIXTURA ASFALTICA BA16

IMBRACAMINTE DE BETON ASFALTIC CU AGREGATE MARUNTE
EXECUTATA LA CALD. IN GROSIME DE: 4,0 CM CU
ASTERNERE MANUALA

AMORSAREA SUPRAFETELOR STRATURILOR DE BAZA SAU A I
IMBRACAMINTELOR EXISTENTE IN VEDEREA APLICARII UNUI

MIXTURA ASFALTICA TIP BAD22,4

EXECUTANT
SC LODOB CONSULTING SRL

Formular F3

OBIECTIV: 96 AMENAJARE TROT IN COM. STRAJA, JUD. SUCEAVA, DE LA CIRCUIT DIMITRIE (IONASCU-NR.899) PANA LA CIRCUIT ILIE(JELEA-NR.943)

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 1 EXECUTIE TROTUARE

Categoria de lucrari: 02 2 PODETE

Nota de renuntare: 01 NR 01

Executant: LODO Obiectiv 96

Ob101

Cate02

NR01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
a) materiale					
b) manopera					
c) utilaj					
d) transport					
Total(a+b+c+d)					

0	1	2	3	4	5
SECTIUNE TEHNICA					
SECTIUNE FINANCIARA					

1	TSC04G1	82	SUTE MC	0,21000	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44	59,44	0,00	0,00
SAPATURA MECANICA CU EXCAVATOR PE SENILE DE 0.71-1.25 MC, CU MOTOR CU ARDERE INTERNA SI COMANDA												
2	TSA02E1	82	M CUB	20,00000	0,00	28,38	567,60	0,00	567,60	0,00	0,00	0,00
SAPATURA MANUALA DE PAMANT IN SPATII LIMITATE, AVA												
3	TRB01C12	82	TONE	35,40000	0,00	12,43	439,91	0,00	439,91	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR												
UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M												
4	TRA01A05P	82	TONE	38,40000	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU												
AUTOBASCULANTA DIST. = 5 KM												
5	TSD01D1	82	M CUB	20,00000	0,00	2,08	79,87	0,00	79,87	0,00	0,00	0,00
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT, AFINAT, STRAT UNIFIO												
RM 10-30CM, GROS CU SPARIM, BULG, TEREN F, TARE												
6	TSD04B1	82	M CUB	20,00000	0,40	16,13	322,50	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00
COMPACTAREA CU MAUL DE MANA A UMPLUTURILOR EXECUT												
ATE IN SAPATURI ORIZONTALE SAU INCLINATE LA 1/4,												
7	PB02A1	82	M CUB	2,75000	0,40	46,43	127,67	1,10	127,67	26,13	0,00	154,89
TURNARE BETON SIMPLU B7S IN FUNDATII OBISNUITE, ZID												
DE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL												


7	2100969	M CUB	2,77200	420,00	1164,24
	BETON DE CIMENT	B 250-BC20	STAS 3622	0,00	0,00
8	PB02A1	82 M CUB	16,20000	0,40	6,48
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE, ZID DE SPERIJIN PEREURI ETC. MANUAL			9,50	752,09
				0,00	153,90
				0,00	0,00
8	2100995	M CUB	16,33000	56,33	912,47
	BETON DE CIMENT	B 400-BC30	STAS 3622	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
9	DA06A1	82 M CUB	3,39000	465,00	7593,45
	STRAT DE AGREGATE NATURALE CILINDRATE, AVAND FUNCTI A DE REZIDENTA FILTRANTA, IZOLATOARE, ANTIGELIVA			22,88	77,56
				0,00	0,00
10	PF05A1	82 MP	15,33000	101,05	342,57
	HIDROIZOLATII LA TUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILIERIZ AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI			6,50	99,66
				1,07	16,47
				0,00	0,00
				0,00	0,00
11	PC02A1	82 MP	74,00000	10,85	802,86
	CORAJE PT. BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ. DIN PANO			20,47	1514,54
				0,00	0,00
				0,00	0,00
12	ACC08A1	82 M	75,00000	31,32	2317,40
	MONTARE TUB CIRC. BETON PREC. I-5M DN 400 TIP PREM			6,19	464,16
				28,60	2144,63
				20,75	1556,25
				0,00	0,00
12	6418821	BUCATATA	15,15000	55,53	4165,04
	TUB ADUCT. PREM D= 400 P= 7 L=5 B6005BP ISLGC			2200,00	33330,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
13	PI06A1	82 BUCATA	3,00000	20,35	61,05
	MONTAREA ELEM. PREF. DIN BETON ARMAT CU MACARAU PE PNENURI DE 9,9 TE			26,88	80,63
				112,85	338,55
				0,00	0,00
14	IFB09A1	82 MP	14,33000	5,72	81,97
	STRAT DRENANT DIN: NISIP, BALAST, PIETRIS, PIATRA SPARTA, AVAND GROSIMEA DUPA COMPACTARE DE : 5 CM			2,36	33,89
				0,00	0,00
				0,00	0,00
15	IFA03C1	82 MP	14,33000	0,12	1,72
	PEREU DIN PLACI DE BETON SIMPLU, TURNAT PE LOC IN CAMPURI SEPARATE PANA LA 2 MP SUPRATA, IMPARTITA			30,10	431,33
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				30,22	433,05

0	1	2	3	4	5
15	2100995	M CUB	1,43300	465,00	666,35
BETON DE CIMENT B 400-BC30 STAS 3622					
16	1FA07D1	82 M	14,33000	0,10	1,50
ROSTURAREA PERECUTII DIN DATE PREFABRICATE DIN BETON					
CU MORTAR DE CIMENT, PE ADINCIMEA DE 4 CM SI					
16	2101121	M CUB	0,00900	380,00	3,42
MORTAR DE ZIDARIE M 10 NISIP S 1030					
17	PE01C1	82 M CUB	8,43000	380,00	3,42
ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULESI SI ZID. SPID. D					
IN PIATRA BRUTA ROCA SEDIMENTARA					
18	CC01C1	82 KG	492,00000	0,14	68,88
MONTAREA ARMATURILOR DIN OTEL-BETON IN FUNDATII CO					
NTINUE RI RADIERE (PLACI), DISTANTIER DIN MASE					
PLASTICE					
18	9000252	TONNE	0,49200	6500,00	3198,00
ARMATURA IN PREL. DE BETON PC52 PESTE 10 MM BAREM					
19	CZ0301C1	82 KG	492,00000	6500,00	3198,00
CONECTIIONAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON PENTRU B					
ETON ARMAT IN FUNDATII PASONAREA BARELOR PENTRU B					
20	TRA01A15	82 TONE	13,91000	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALULOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 15 KM.					
21	TRA01A40	82 TONE	16,66000	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALULOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 40 KM.					
22	TRA01A50	82 TONE	5,00000	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALULOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 50 KM.					
23	TRA06A20	82 TONE	45,48000	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5MC DIST. = 20KM					


0	1	2	3	4	5
24	TRA05A05	82 TONE	2,33000		
	TRANSPORT NUTRIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE				
	HIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST.DE 5 KM.S				
				25,00	58,25
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				25,00	58,25
				1.065,43	62.807,15
Cheltuieli directe					
		51.794,91	7.672,19	2.274,61	
	Contrib. aslg. munca	2,2500%	172,62		
	TOTAL CHELT. DIRECTE				
		51.794,91	7.844,82	2.274,61	
	Cheltuieli indirecte	Io = 3,0000% x Io			
		Po = 2,0000% x (To+Io)			
	Profit	TOTAL GENERAL nota renuntare Vo = To+Io+Po			
					1.297,38
					1.889,39
					62.979,77
					172,62

BENEFICIAR

COMUNA STRAJA



EXECUTANT

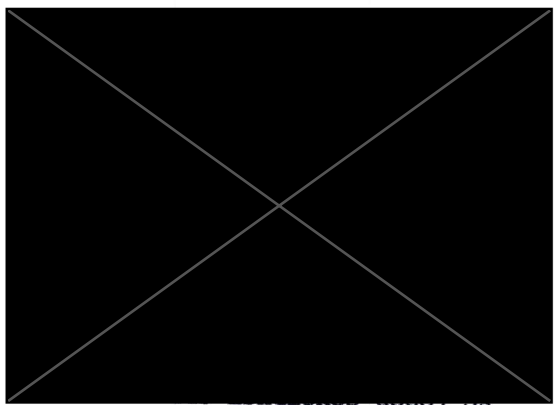

Formular F3

OBIECTIV: 96 AMENAJARE TROT IN COM. STRAJA, JUD. SUCEAVA, DE LA CIRCUIT DIMITRIE (DONASCU-NR.899) PANA LA CIRCUIT ILIE(JELEA-NR.943)

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 I EXECUTIE TROTUARE

Categoria de lucrari: 03 3 RIGOLA CAROSABILA

Nota de renuntare: 01 NR 01

Executant: LODO Obiectiv: 96

Obiectiv

Categorie

U. M.

Cantitatea

NR01

Valoare

a) material
b) manopera
c) utilaj
d) transport
Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

1	TSA19E1	82 M CUB	2,63000	0,00	265,76
---	---------	----------	---------	------	--------

SAPATURA MANUALA A SANTURILOR SI RIGOLELOR TRAPEZOIDALE, PENTRU SCURGAREA APELOR, CU

2	TSC03E1	82 SUTE MC	0,18000	0,00	265,76
---	---------	------------	---------	------	--------

SAPATURAMECANICA CU EXCAVATORUL DE 0.40-0.70 MC, CU MOTOR CU ARDERE INTERNA SI COMANDA HIDRAULICA,

3	TSC35B31	82 SUTE MC	0,10000	0,00	64,94
---	----------	------------	---------	------	-------

EXCAVAT, TRANSPORT, CU INCARCATOR FRONTAL, LA DISTANTA DE: INCARCARE IN AUTOVEHICUL CU INCARCATOR

4	TSE03B1	82 SUTE MP	0,61000	0,00	32,60
---	---------	------------	---------	------	-------

FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T.M. ILOCITIU

5	TRA01A04P	82 TONE	33,00000	0,00	132,33
---	-----------	---------	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOTULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 4 KM

6	DA06A1	82 M CUB	5,78000	1,67	55,12
---	--------	----------	---------	------	-------

STRAT DE AGREGATE NATURALE CILINDRATE, AVAND FUNCTIA DE REZIDENTA FILTRANTA, IZOLATOARE, ANTIGELIVA

7	PC02A1	82 MP	123,00000	10,85	1334,49
---	--------	-------	-----------	-------	---------

COPRAJE PT. BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ. DIN PANOURI CU PLACAT P CU SUPRAFEETE PLANE

				31,32	3851,90
--	--	--	--	-------	---------

	0	1	2	3	4	5
8	PB06A1	82 M CUB	15,26000	0,40	51,43	6,10
				8,93	784,78	
				0,00	136,20	
8	2100996	M CUB	15,38200	60,75	927,08	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				480,00	7383,36	
9	CC01C1	82 KG	87,00000	0,14	12,18	
				0,43	37,41	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				6500,00	565,50	
9	9000253	STONE	0,08700	0,57	49,59	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				480,00	7383,36	
10	CZ0301C1	82 KG	87,00000	6500,00	565,50	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				6,57	571,16	
				0,47	41,15	
				0,13	11,10	
				0,00	0,00	
11	DE16A1	82 BUCATA	120,00000	7,17	623,41	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				6,45	773,95	
				0,00	0,00	
11	2800430	BUCATA	120,84000	6,45	773,95	
				25,00	3021,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				25,00	3021,00	
12	TRA01A30	82 TONE	18,00000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				8,34	150,12	
13	TRA06A20	82 TONE	36,00000	8,34	150,12	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				8,34	300,24	
14	ACA10B1	82 M	22,00000	19,21	422,65	
				5,38	118,25	
				0,07	1,43	
				0,00	0,00	
				24,65	542,33	
				4,814,42	378,51	
				505,47	19,323,31	
				108,32	108,32	
				4,922,75	378,51	
				505,47	19,431,63	
				582,95		

Executant	Obiectiv	Cate	NR	Unitate	Valoare
0	1	2	3	4	5
Profit					400,29
TOTAL GENERAL nota renuntare Vo = To+Io+Po					20,414,87



Formula F3

BENEFICIAR

COMUNA STRAJA

EXECUTANT

SC LODOR CONSTRUCT SRL



OBIECTIV: 96 AMENAJARE TROT IN COM. STRAJA, JUD. SUCEAVA, DE LA CIRCUIT DIMITRIE (DONASCU-NR.899) PANA LA CIRCUIT ILIE(JELEA-NR.943)

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 I EXECUTIE TROTUARE
Categorie de lucrari: 04 PUNTE PIETONALA
Nota de renunțare: 01 NR 01

Nota de renunțare: 01 NR 01

Executant LODO Objective 96 Obi 01 Case 04

Nr. crt.	Capitolul de lucru	U. M.	Canitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total(a+b+c+d)	

[illegible]

0	1	2	3	4	5
6	CA02C1	82 M CUB	18,20000	0,40	7,28
TURNAREA BETONULUI ARMAT IN ELEMENTELE CONSTRUCTII					
TOR, EXCLUSIV CELE EXECUTATE IN COFRAJE GLISANTE					
6	2100995	M CUB	18,34600	465,00	8530,89
BETON DE CIMENT B 400-BC30 STAS 3622					
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				465,00	8530,89
7	TRA06A20	82 TONE	90,72000	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM					
				8,34	756,60
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
8	C051A	09 BUCATA	4,00000	0,00	0,00
MONTARE GRINDA					
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,15	0,60
				0,00	0,00
8	6401490	BUCATA	4,00000	140,00	560,00
GRINDA PUNTE					
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				140,00	560,00
9	RPC023A1	82 MP	22,00000	28,55	628,07
PODINA INTRE GRINZI PENTRU SUSTINEREA UMPLUTURII L					
A PLANSEE DIN LEMN CU DESCHIDERE PESTE 4 M					
				13,54	297,99
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				42,09	926,06
10	DF09A1	82 M	50,00000	228,54	11426,98
PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA					
SI STILPI METALICI					
				19,58	978,83
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				248,12	12405,81
11	TRA01A20	82 TONE	120,00000	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALULOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 20 KM.					
				8,34	1000,80
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				8,34	1000,80
Cheltuieli directe					
			30.650,24	4.643,04	37.894,39
Alte cheltuieli directe					
			104,47	797,44	104,47
Contrib. asig. munca					
			2,2500%		
TOTAL CHELT. DIRECTE					
			30.650,24	4.747,51	37.998,86
Cheltuieli indirecte					
			Io = 3,0000% x To		
			Po = 2,0000% x (To+Io)		
Profit					
					782,78
TOTAL GENERAL nota renuntare Vo = To+Io+Po					
					39.921,60

BENEFICIAR

EXECUTANT

SC LOD

Formular F3

OBIECTIV: 96 AMENAJARE TROT IN COM. STRAJA, JUD. SUCCEAVA, DE LA CIRCUIT DIMITRIE (ONASCU-NR.899) PANA LA CIRCUIT ILIE(JELEA-NR.943)

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari NC

Obiectul: 01 I EXECUTIE TROTUARE

Categoria de lucrari: 01 I PAVAJ

N.C.S.: 011 NC

Nr. crt.	Capitolul de lucru	U. M.	Cantitatea	Preț unitar	a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA	
Executanti	LODO	Obiectiv96	Ob101	Cate01	NC011						
				</							

1	TSC04G1	82	SUTE MC	0,44000	0,00	0,00	0,00	124,54	0,00	124,54
SAPATURA MECANICA CU EXCAVATOR PE SENILE DE 0,71-1,25 MC, CU MOTOR CU ARDERE INTERNA SI COMANDA										

2	TSA02C1	82	M CUB	3,45000	0,00	45,37	0,00	156,51	0,00	156,51
SAPATURA MANUALA DE PAMANT IN SPATII LIMITATE, AVA										
ND SUB 1.00 M LATIME SAU PESTE 1.00M LATIME,										
EXECUTATA FARA SPRIDINI, TALUZ VERTICAL, LA FUNDATII, CANALE, SUBSOLURI, DRENURI, TREPTE DE INFRASTRUC. ETC. IN										
PAMANT NECOEZIV SAU STAB COEZIV ADVANCIAT, 0,75M TEREN TARE										


3	TSD01C1	82	M CUB	3,45000	0,00	9,31	0,00	32,12	0,00	32,12
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMANT, AFINAT, STRAT UNIFO										
RM 10-30CM. GROS CU SPALIM. BULG. TEREN PAMANT										
COEZIV										
4	TSD04A1	82	M CUB	3,45000	0,40	18,71	0,00	64,53	0,00	64,53
COMPACTAREA CU MAUL DE MANA A UMPLUTURILOR EXECUT										
ATE IN STRATURII ORIZONTALE SAU INCLINATE LA 1/4,										
INCLUSIV UDAREA FIECARUI STRAT DE PAMANT IN PARTE, AVAND: 10 CM GROSIME PAMANT NECOEZIV										

5	TSE03B1	82	SUTE MP	1,50000	0,00	216,94	0,00	325,40	0,00	325,40
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T. M. LOCULUI										
6	TSC35A1	82	SUTE MC	1,50000	0,00	216,94	0,00	325,40	0,00	325,40
EXCAVAT, TRANSPORT, CU INCARCATOR FRONTAL, LA DISTANT										
E DE: INCARCARE IN AUTOVEHICUL CU INCARCATOR										
FRONTAL PE SENILE DE 0,5-0,99 MC, PAMANT DIN TEREN CATEGORIA I LA DISTANTA < 10M										


0	1	2	3	4	5
7	TRA01A05P	82 TONE	79,15000		
8	TRA05A05	82 TONE	2,53000		
9	DA06A1	82 M CUB	50,56000		
10	DA06A2	82 M CUB	9,44000		
11	DE10A1	82 M	543,00000		
12	2100995	M CUB	10,95000		
13	DD02A2	82 MP	701,00000		
14	ACE201A01+	09 M	23,00000		
14	2100995	M CUB	2,30000		
15	00609Q11	02 BUCATA	76,00000		

16	TRB01B13	82 TONE	60,78000	0,00	19,48	1183,92	0,00	0,00	0,00	3
TRANSPORTUL MATERIALIETOR CU ROABA PE PNEURI INC AR										1183,92
UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M										
										0,00
17	TRA01A50	82 TONE	60,78000	0,00	19,48	1183,92	0,00	0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALIETOR, SEMIFABRICATELO										2228,80
R CU AUTOBASCUANTIA PE DIST. = 50 KM.										2228,80
18	TR11A08F1	82 TONE	60,78000	0,00	7,53	457,37	0,00	0,00	0,00	
DESCARCAREA MATERIALIETOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE										457,37
PRIN TRANS. PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.										0,00
19	TRA06A20	82 TONE	31,80000	0,00	7,53	265,21	0,00	0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO										265,21
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM										265,21
20	TRA01A30	82 TONE	127,78000	0,00	8,34	1065,69	0,00	0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALIETOR, SEMIFABRICATELO										1065,69
R CU AUTOBASCUANTIA PE DIST. = 30 KM.										1065,69
21	ACD01F1	82 BUCATA	10,00000	1515,38	254,00	15153,82	2540,01	0,00	0,00	
CAPACE GRILA TIP GEIGER										17693,83
22	00611A10	02 M	298,85705	179,22	50,21	53561,16	15006,37	0,00	0,00	
MONTARE TEAVA CORUGATA										68567,53
Cheltuieli directe										238.991,16
Alte cheltuieli directe										1.298,41
Contrib. asig. munca										2,250%
TOTAL CHELT. DIRECTE										174.252,04
Cheltuieli indirecte										59.005,65
Io = 3,0000% x To										3.244,30
Profit										7.208,69
Po = 2,0000% x (To+Io)										240.289,57
TOTAL GENERAL pe categorii										4.949,97
Vo = To+Io+Po										252.448,22

BENEFICIAR



EXECUTANT



SC LODOR CONSTRUCT SRL

Formular F3

OBIECTIV: 96 AMENAJARE TROT IN COM. STRAJA, JUD. SUCEAVA, DE LA CIRCUIT DIMITRIE (DONASCU-NR.899) PANA LA CIRCUIT ILIE(JELEA-NR.943)

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari NCS

Obiectiv: 01 I EXECUTIE TROTUARE

Categoria de lucrari: 01 I PAVAJ

N.C.S.: 02 NCS

Executant/L.O.D.O. Obiectiv96

Ob101

Cate01


NC02

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total(a+b+c+d)	
0					
1					
2					
3					
4					
5					

22	00611A10	02 M	37,14295	179,22	6656,76
				50,21	1865,04
				0,00	0,00
				0,00	0,00
23	00609A6	02 BUCATA	1,00000	229,43	8521,80
				2813,83	2813,83
				295,00	295,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				3108,83	3108,83
24	CO06B	02 M	18,80000	293,53	5518,30
				23,65	444,62
				0,00	0,00
				317,18	5962,92
26	E113A1	82 BUCATA	4,00000	3904,26	15617,05
				385,00	1540,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				4289,26	17157,05
27	EC05D1	82 M	42,00000	14,19	595,98
				6,45	270,90
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				20,64	866,88
28	W1R07A1	82 M	42,00000	10,66	447,58
				28,98	1217,22
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				39,64	1664,80
29	TCB21K2	82 BUCATA	3,00000	0,00	0,00
				0,00	0,00
				490,00	1470,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				490,00	1470,00



0	1	2	3	4	5
Executant	Obiectiv	Obiectiv	Cate	NC	Formular F3
29	3270879	BUCATA	1,00000	2850,00	2850,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				2850,00	2850,00
29	3270880	BUCATA	1,00000	2850,00	2850,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				3700,00	3700,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				3700,00	3700,00
29	3270881	BUCATA	1,00000	4050,00	4050,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				4050,00	4050,00
30	CG03B1	82 MP	54,20000	4050,00	4050,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				32,20	1745,25
				125,76	6815,93
31	RPAB01C1	82 BUCATA	59,00000	158,75	9366,25
				50,00	2950,08
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				208,75	12316,33
32	00609A2	02 BUCATA	10,00000	1303,29	13032,88
				95,00	950,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				1398,29	13982,88
33	GB02A1	82 BUCATA	1,00000	9900,00	9900,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				9900,00	9900,00
34	H1C15A	82 BUCATA	1,00000	18365,69	18365,69
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				18365,69	18365,69
PODINA DE SUSTINERE METALICA-PROCURARE SI MONTAJ					
(8) CUZINETI FILET M18, 8 PLACI DEBITARE (12MM), VOPSEA GRI ANTRACIT, TABLA STRIATA (5MM)					
Cheltuieli directe	97.984,99	12.748,11	0,00	0,00	110.733,10
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca	2,2500%				
TOTAL CHELT. DIRECTE	97.984,99	13.034,95	0,00	0,00	286,83
Cheltuieli indirecte	Io = 3,0000% x Io				111.019,93
Profit	Io = 2,0000% x (Io+Io)				3.330,60
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = Io+Io+Po				2.287,01
					116.637,54



BENEFICIAR
COMUNA STRAJA

EXECUTANT
SC LODOR CONSTRUCT SRL

Executant	Obiectiv	Cate	NC	Form
0	1	2	3	4
1	2	3	4	5

Formular F3

OBIECTIV: AMENAJARE TROTUARE IN COMUNA STRAJA, JUD. SUCEAVA, DE LA CIRCIU DIMITRIE (IONASCU-NR.899) PANA LA CIRCIU ILIE(JELEA-NR.943)

BENEFICIAR: COMUNA STRAJA


CENTRALIZATORUL FINANCIAR SITUATIE DE PLATA NR.3

Nr. crt.	Obiecte / categorii de lucrari	VALOARE OFERTA	NR	NC	NCS	VALOARE CONTRACT DUPA DS1	INCASAT ANTERIOR	LUNA CURENTA			TOTAL DECONTAT
		Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	OFERTA	NC	NCS	Lei
1	Obiectul 1	581.897,44	252.448,22	252.448,22	116.637,54	698.534,98	199.530,89	129.918,33	252.448,22	116.637,54	698.534,98
2	Pavai	450.880,02	125.945,20	252.448,22	116.637,54	694.020,58	199.530,89	125.403,93	252.448,22	116.637,54	694.020,58
3	Podete	66.166,55	66.166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rigola carosabila	20.414,87	20.414,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Punte pietonala	44.436,00	39.921,60	0,00	0,00	4.514,40	0,00	4.514,40	0,00	0,00	4.514,40
6	TOTAL	581.897,44	252.448,22	252.448,22	116.637,54	698.534,98	199.530,89	129.918,33	252.448,22	116.637,54	698.534,98
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :		581.897,44	252.448,22	252.448,22	116.637,54	698.534,98	199.530,89	129.918,33	252.448,22	116.637,54	698.534,98
Taxa pe valoarea adaugata		110.560,51	47.966,16	70.126,29	369.086,76	698.534,98	199.530,89	499.004,09	94.810,78	132.721,65	698.534,98
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :		692.457,95	300.413,38	439.212,05	831.256,63	831.256,63	237.441,76	593.814,87			831.256,63

EXECUTANT
SC LODOR CONSTRUCT SRL

BENEFICIAR
COMUNA STRAJA

SOCIETATE



OBIECTIV: 96 AMENAJARE TROT IN COM. STRAJA, JUD.SUCEAVA, DE LA CIRCIU DIMITRIE (IONASCU-NR.899) PANA LA CIRCIU ILIE(JELEA-NR.943)

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Categoría de lucrari: 01 I PAVAJ

Executants LODO Obiectiv 96

hxeeculantLODO Obiectiv96

10790

Case 01

O.M. Cantitatea

Nr. crt. Capitolul de lucru Simbol

Denumiri
Observa
Corectii

Observații
Corecții

1139100

SEC _____

SECTIONE TEHNICA

SECTIONNE FINANCIARA

Valoare

Plata 03

Pretul unitar
a) materiale


b) manopera
c) utilaj

(d) transport
Total(a+b+c+d)

[illegible]



Executant	L.O.D.O.	Obiectiv	96	1	2	3	4	5
9	TRA05A05	82 TONE	18,16000	0,00	0,00	0,00	25,00	454,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHICULE SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC.) PE DIST. DE 5 KM. \$								
10	DA06A1	82 M CUB	360,14000	53,37	24,81	22,88	25,00	454,00
STRAT DE AGREGATE NATURALE CILINDRATE, AVAND FUNCTIA DE REZISTENTA FILTRANTA, IZOLATOARE, ANTIGELIVA								
11	DA06A2	82 M CUB	48,97000	145,14	24,81	22,88	101,05	36393,30
STRAT AGREG NAT (NISIP) CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA								
12	DE1A1	82 M	159,00000	22,11	6,52	0,00	192,82	9442,55
BORDURI MICI, PREFABRICATE DIN BETON CU SECTIUNEA DE 10X15CM, PENTRU INCADRAREA SPATIILOR VERZI, PROTECTIE, ALTEI ETC., ASEZATE PE O FUNDATIE DIN								
12	2100995	M CUB	3,18000	465,00	0,00	0,00	28,63	4552,77
BETON DE CIMENT B 400-BC30 STAS 3622								
13	DD02A1	82 MP	466,00000	59,95	14,35	0,46	0,00	1478,70
PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN SUBSTRAT DE NISIP								
14	TRB01B13	82 TONE	140,88000	74,75	0,00	0,00	0,00	34835,70
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INCARUNCARA DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M								
15	TRA01A50	82 TONE	140,88000	19,48	0,00	0,00	0,00	2744,17
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOABASCULANTA PE DIST. = 50 KM. \$								
16	TR11A08F1	82 TONE	140,88000	36,67	0,00	0,00	0,00	5166,07
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS. PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.								
22	TRA06A20	82 TONE	6,36800	0,00	0,00	0,00	8,34	53,11
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 20KM \$								



BENEFICIAR
COMUNA STRAJA

EXECUTANT
SC LODOR CONSTRUCT SRL

Executant	LODO	Obiectiv	Cate	Plata	Formular
0	1	Obiectiv 96	2	4	5
23	TRA01A30	82 TONE	3	833,78000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALULOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOTRASCUTANTA PE DIST. = 30 KM.					
\$					
Cheltuieli directe	59.265,85	25.675,06	20.072,84	13.772,67	118.786,41
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca	2,2500%				
TOTAL CHELT. DIRECTE	59.265,85	25.675,06	20.072,84	13.772,67	118.786,41
Cheltuieli indirecte					
Io = 3,0000% x To					
Po = 2,0000% x (To+Io)					
V = To+Io+Po					
OS = 0,000% x V					
Total fara TVA					
T.V.A.					
TVA= 19,000% x (V+OS)					
TOTAL GENERAL situatie lucrar					
577,69					
577,69					
59.265,85					
26.252,74					
20.072,84					
13.772,67					
119.364,10					
3.580,92					
2.458,90					
125.403,93					
0,00					
125.403,93					
23.826,75					
149.230,67					

Formular F3

OBIECTIV: 96 AMENAJARE TROT IN COM. STRAJA, JUD.SUCEAVA, DE LA CIRCU DIMITRIE (ONASCU-NR.899) PANA LA CIRCU ILIE(JELEA-NR.943)

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari - Situatii de plata nr.3

LISTA

Obiectul: 01 I EXECUTIE TROTUARE
Categorie de lucrari: 04 4 PUNTE PIETONALA
Situatie de lucrari: 01 Plata 03

Excutant/LODO Obiectiv96 Obiectiv96

Nr. crt. Capitolul de lucrari U. M. Cantitatea

Simbol Denumire resursa Corectii Observatii

SECTIUNE TEHNICA

0 1 2 3 4 5

TSC02A1 82 SUTE MC 0,09400

SAPATURA MECANICA CU EXCAVATOR PE PNEURI DE 0.12-0.39 MC, CU COMANDA HIDRAULICA, IN: PAMANT CU

2 TRA01A02P 82 TONE 16,92000

TRANSPORTUL ROTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM

3 CB01A1 82 MP 4,60000

COFRAJE PENTRU BETON IN CUZINETI, FUNDATII PAHAR S I FUNDATII DE UTILAJE SIMPLE CU FORME REGULATE DIN

4 CC01A1 82 KG 80,00000

MONTAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON IN FUNDATII IZ OLANE (INCLUSIV FUNDATII PAHAR), CU DIAMETRUL

4 64333780 KG 80,00000

ARMATURI IN PREFABR BETON PC 52 PESTE 10 MM BAREM

5 CA01A1 82 M CUB 6,00000


TURNAREA BETONULUI SIMPLU MARCA...1) IN FUNDATII C ONTINUE, IZOLATE SI SOCIURI CU VOLUM PANA LA 3 MC, INCLUSIV

5 2100969 M CUB 6,04800

BETON DE CIMENT B 250-BC20 STAS 3622

420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540,16

420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540,16



COMUNA STRAJA
BENEFICIAR

EXECUTANT
SC LODOR CONSTRUCT SRL

[illegible]

Formular F3

OBIECTIV: 96 AMENAJARE TROT IN COM. STRAJA, JUD. SUCEAVA, DE LA CIRCUIT DIMITRIE (ONASCU-NR.899) PANA LA CIRCUIT ILE(PELEA-NR.943)

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari - NC Situatii de plata nr.3

Obiectiv: 01 I EXECUTIE TROTUARE									
Categorie de lucru: 01 I PAVAJ									
N.C.S.: 011 NC									
Situatie de lucru: 01 Plata 03									
ExecutantLODO Obiectiv96									
Nr.	Capitolul de lucru	U. M.	Cantitatea	Valoare					
	Simbol			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)	
	Denumire resursa			Pretul unitar					
	Observatii								
	Corectii								
0	1	2	3	SECTIUNE TEHNICA					
				SECTIUNE FINANCIARA					
				4					
				5					
				0.44000					
				TSC0461 82 SUITE MC					
				1					

7	TRA01A05P	82	TONE	79,15000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,63	164,65
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM											
6	TSC35A1	82	SUTE MC	1,50000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1428,00	1428,00
EXCAVAT, TRANSPORT, CU INCARCATOR FRONTAL, LA DISTANT E DE: INCARCARE IN AUTOVEHICUL CU INCARCATOR											
5	TSE03B1	82	SUTE MP	1,50000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,40	325,40
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T. MIILOCIU											
4	TSD04A1	82	M CUB	3,45000	0,40	18,71	0,00	0,00	0,00	1,38	64,53
COMPACTAREA CU MAIUL DE MANA A UMPLUTURILOR EXECUTATE IN STRATURI ORIZONTALE SAU INCLINATE LA 1/4,											
3	TSD01C1	82	M CUB	3,45000	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12
IMPRASTIEREA CU LOBATA A PAMANT, ALINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM. GROS CU SPARIM. BULG. TEREN PAMANT COEZIV											
2	TSA02C1	82	M CUB	3,45000	0,00	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	124,54
SAPATURA MANUALA DE PAMANT IN SPATII LIMITATE, AVA ND SUB 1.00 M LATIME SAU PESTE 1.00M LATIME,											
SAPATURA MECANICA CU EXCAVATOR PE SENILE DE 0.71-1.25 MC, CU MOTOR CU ARDERE INTERNA SI COMANDA											



Executant/LODO	Obiectiv96	Cate01	NC011	Plata 01	ron
8	TRA05A05	82 TONE	2,53000		5
TRANSPORT RUTIER MATERIAL, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$					
9	DA06A1	82 M CUB	50,56000		63,25
0,00					
25,00					
25,00					
63,25					
2698,29					
1254,15					
1156,81					
0,00					
5109,25					
1370,10					
234,16					
215,99					
0,00					
1820,25					
24441,52					
9231,03					
0,00					
33672,55					
12	2100995	M CUB	10,95000		
BETON DE CIMENT B 400-BC30 STAS 3622					
465,00					
0,00					
0,00					
0,00					
5091,75					
13	BD02A2	82 MP	701,00000		
PAVAZ EXECUTAT CU PAVELE NORMALE CALIT II PE UN					
SUBSTR DE NISIP					
PAVAZ 8 CM					
14	ACE201A01+	09 M	23,00000		
(ASIMILAT) RIGOLA STRADALA MATERIAL+MONTAJ (PREFABR					
ICATA)					
11454,00					
6900,03					
0,00					
0,00					
18354,03					
14	2100995	M CUB	2,30000		
BETON DE CIMENT B 400-BC30 STAS 3622					
465,00					
1069,50					
15	00609Q11	02 BUCATA	76,00000		
ASIMILAT-CAPAC RIGOLA					
127,50					
36,80					
2796,78					
9690,00					
1069,50					
16	TRB01B13	82 TONE	60,78000		
TRANSPORTUL MATERIALULOR, SEMIFABRICATELO					
UNCARE DESC ARUNCARE GRUPE 1-3 DISTANTA 30M					
1183,92					
0,00					
0,00					
0,00					
1183,92					
17	TRA01A50	82 TONE	60,78000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALULOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCUANTIA PE DIST. = 50 KM. \$					
0,00					
0,00					
0,00					
36,67					
2228,80					
2228,80					

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
BOTA PETRU-SERBAN
LEA OFTIE DE SANTIAR
AVUT NR. 28425
DIRECTORATUL ROMANIA
1992

EXECUTANT
SC LODOR CONSTRUCT SRL

Executiv	Obiectiv	Categorie	NC	Plata	Formular
0	1	2	3	4	5
18	TR11A08F1	82 TONE	60,78000		
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE					
PRIN TRANS. PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.					
19	TRA06A20	82 TONE	31,80000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM					
20	TRA01A30	82 TONE	127,78000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALULOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 30 KM.					
21	ACD01F1	82 BUCATA	10,00000		
CAPACE GRILA TIP GEIGER					
22	0061A10	02 M	298,85705		
MONTARE TEAVA CORUGATA					
Cheltuieli directe					
174,252,04 57,707,24 3,244,30 3,787,58 238,991,16					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca 2,2500%					
TOTAL CHELT. DIRECTE 1,298,41					
Cheltuieli indirecte					
Io = 3,0000% x To 174,252,04 59,005,65 3,244,30 3,787,58 240,289,57					
Profit					
Po = 2,0000% x (To+Io) 7,208,69					
Valoare					
V = To+Io+Po 4,949,97					
Organizare de santier					
OS = 0,000% x V 252,448,22					
Total fara TVA					
T.V.A.					
TVA= 19,000% x (V+OS) 300,413,38					
TOTAL GENERAL situatie lucrat					

Formular F3

OBIECTIV: 96 AMENAJARE TROTIN COM. STRAJA, JUD. SUCEAVA, DE LA CIRCUIT DIMITRIE (ONASCU-NR.899) PANA LA CIRCUIT ILIE(JELEA-NR.943)

LISTA
cu cantitatile de lucru pe categorii de lucru - NCS Situatii de plata nr.3

Nr. crt.	Capitolul de lucru	U. M.	Cantitatea	Preț unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
Executant LODO	Obiectiv 96	Cate 01		Plata 01				
Obiectiv: 01 I EXECUTIE TROTUARE								
Categorie de lucru: 01 I PAVAJ								
N.C.S.: 02 NCS								
Situatie de lucru: 01 Plata 03								


SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ				
0	1	2	3	4	5			

22	00611A10	02 M	37,14295	179,22	6656,76	1865,04	0,00	0,00	8521,80
MONTARE TEAVA CORUGATA									
23	00609A6	02 BUCATA	1,00000	229,43	2813,83	295,00	0,00	0,00	8521,80
CAMIN CAPTARE IZVOR									
24	CO06B	02 M	18,80000	3108,83	5518,30	444,62	0,00	0,00	3108,83
IMPREJUMUIRE LOC DE JOACA									
26	E113A1	82 BUCATA	4,00000	317,18	15617,05	1540,00	0,00	0,00	5962,92
PROCURARE+MONTARE STALPI DE ILUMINAT									
27	EC05D1	82 M	42,00000	4289,26	17157,05	270,90	0,00	0,00	595,98
CABLU ENERGIE +TUB CORUGAT PROTECTIE CABLURI									
28	W1R07A1	82 M	42,00000	20,64	866,88	447,58	0,00	0,00	1664,80
BANDA OTET 40X6MM NEZINGATA, PT.PRIZA DE LEGARE LA PAMINT,LEA INALTA TENSIUNE IN TEREN NORMAL									
29	TCB21K2	82 BUCATA	3,00000	39,64	1664,80	0,00	0,00	0,00	1470,00
ASIM-PROCURARE SI MONTARE ECHIPAMENTE DE JOACA									
				490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1470,00

Executant	LODO	0
Obiectiv	96	1
Obi01		2
Cate01		3
NC02		4
Plata 01		5


EXECUTANT
SC LODOR CONSTRUCT SRL

BENEFICIAR
COMUNA STRAJA

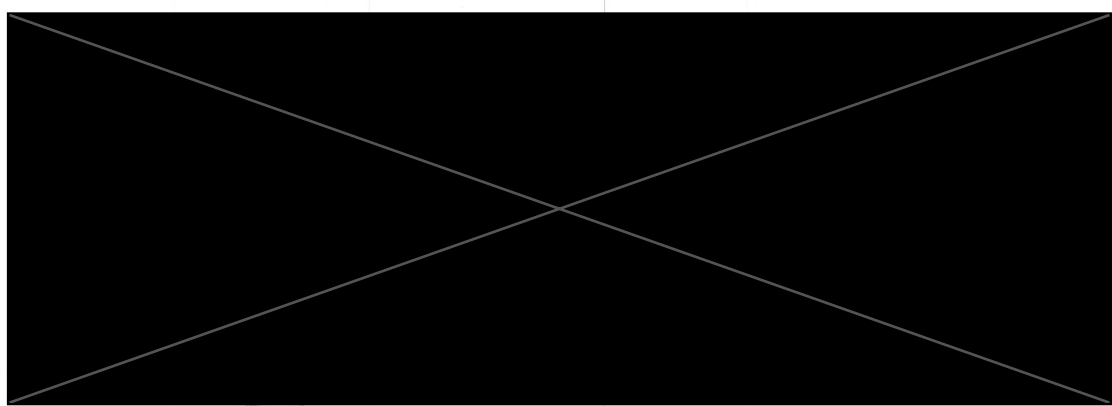

NOTĂ DE CONSTATARE

Nr. 1 din



Subsemnatii:

- dl. Juravile Mihai – primar al Comunei Straja,

- ing. Bota Serban – diriginte de șantier,

- ing. Cristea Claudiu Dumitru – din partea S.C. NOVA PROIECT S.R.L,

- dl. Mironescu Dorinel – din partea S.C. LODOR CONSTRUCT S.R.L,

cu ocazia deplasării la obiectivul de investiții „Amenajare trot. in com. Straja, jud. Suceava, de la Carciu Dimitrie (Ionascu-nr.899) pana la Carciu Ilie (Jelea-nr.943)”, am constatat că se impun o serie de modificări, respectiv:

1. Pentru a asigura o rezistență sportivă a trotuarului în zonele prin care se face alimentarea cu apă a depozitelor din zona „La Troacă” s-a propus utilizarea a 701 mp pava cu grosime 8cm, astfel s-a renunțat la 513 mp pava cu grosimea de 6cm,
2. Pentru a reconfigurarea spațiului public s-a propus executia unui spațiu de joacă prevăzut cu echipamente de joacă, gazon sintetic, 4 stalpi pentru a asigura iluminatul iar pentru protecție a fost construită o împrejmuire cu sîpci din lemn,
3. Pentru a proteja zona pietonală din zona „La Troacă” s-a dispus utilizarea a 543ml bordura din beton cu înălțimea de 25cm, astfel s-a renunțat la 1116 ml bordura mică 10x15,
4. Pentru a asigura o captare eficientă a apelor pluviale s-a propus folosirea a 23ml rigola carosabilă cu capac, 336ml teava corugată și 10 geigere cu gratar împreună cu 10 camine de vizitare,
5. S-a propus modernizarea fântânii care captează izvorul cu apă potabilă,
6. A fost necesară ridicarea a în cota a 69 de capace provenite de la canalizarea existentă,
7. Pentru a spori rezistența punții pietonale au fost înlocuite materialele lemnoase cu materiale metalice,

Față de cele constatate, proiectantul va stabili soluția tehnică pentru asigurarea funcționalității, stabilității și rezistenței în timp a proiectului, va emite dispoziția de șantier și va elabora documentația necesară.

Predat:

BENEFICIAR :

Primaria Straja

-

dl. Juravle M

Diriginte Santier


-

ing.

PROECTANT:

S.C. NOVA PROECT S.R.L – ing. Criste

CONSTRUCTOR: LODOR CONSTRUCT SRL – dl. Mironescu Dorin

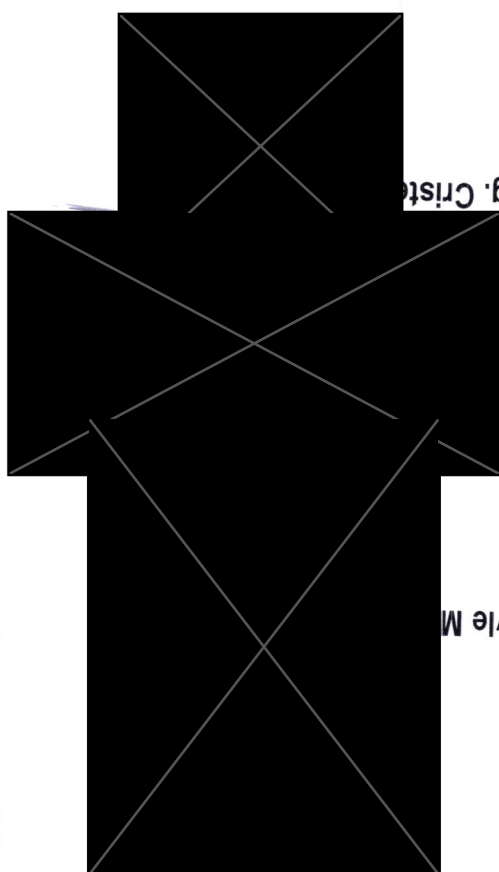

PROIECTANT : SC.NOVAAPROJECT SRL
beneficiar comuna Straja


nr. Proiect	faza
...../2022	PT

Amenajare trotuar în comuna Straja, Județul Suceava, de la Cîrcuș Ilieț (Ionașcu-nr.899) până la Cîrcuș Ilieț (Ionașcu-nr.943)
DEVIZ GENERAL CONFORM H.G. 907/2016 privind cheltuielile necesare realizării obiectivului :

Nr. Crt	Denumirea capitolelor și subcapitole de cheltuieli	1	2	3	4	5
		Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)		
1.1.	Obținerea terenului	0	0	0	0	0
1.2.	Amenajarea terenului	0	0	0	0	0
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0	0	0	0	0
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0	0	0	0	0
	Total Capitol 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie					
	Total Capitol 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.	Studii	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3.1.1 Studii teren	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3.1.3 Alte studii specifice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	Documentații- suport și cheltuieli pentru obținere de avize și acorduri	4000,000	0,000	4000,000	0,000	4000,000
3.3.	Expertiza tehnică	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	Proiectare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3.5.1.Tema de proiectare	51200,000	0,000	51200,000	0,000	51200,000
	3.5.2. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3.5.3.Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3.5.4.Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	20000,000	0,000	20000,000	0,000	20000,000
	3.5.5.Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3.5.6.Proiect tehnic și detalii de execuție	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	Organizare procedurii de achiziție	31200,000	0,000	31200,000	0,000	31200,000
3.7.	Consultanță	6500,000	0,000	6500,000	0,000	6500,000
	3.7.1.Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3.7.2.Auditul financiar	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.8.	Asistență tehnică	19,000,000	0,000	19,000,000	0,000	19,000,000
	3.8.1.Asistență tehnică din partea proiectantului	22610,000	0,000	22610,000	0,000	22610,000
	3.8.1.1.pe perioada de execuție a lucrărilor	3200,000	0,000	3200,000	0,000	3200,000
	3.8.1.2.pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC	2000,000	0,000	2000,000	0,000	2000,000
	3.8.2. Dirigenție de șantier	1200,000	0,000	1200,000	0,000	1200,000
	Total Capitol 3	80,700,000	0,000	80,700,000	0,000	80,700,000
	CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1.	Construcții și instalații	698.534,980	0,000	698.534,980	0,000	698.534,980
4.2.	Montaj utilităților,echipamente tehnologice și funcționale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3.	Utilitățile,echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.	Utilitățile,echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5.	Dotări:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.6.	Active necorporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Total Capitol 4	698.534,980	0,000	698.534,980	0,000	698.534,980
	CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli					
	Total Capitol 5	132.721,646	0,000	132.721,646	0,000	132.721,646
	Total	831.256,626	0,000	831.256,626	0,000	831.256,626

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRAJA
Județul Suceava
Anexa nr. la H.C.L. nr.
conține pagini

Județul Suceava
Comuna Straja
11.06.2022
4763



Intocmit
Ing. Cristea Claudiu



marți, 3 iunie 2025

Data

Semnul (.) este separator al (1000) milior


In preturi la data de			
marti, 3 iunie 2025		I euro = 5,0587	
5.1	Organizare de santier	0,000	0,000
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,000	0,000
5.1.2	Cheltuieli conex organizarii santierului	0,000	0,000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	8,183,885	0,000
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii	8,183,885	0,000
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0,000	0,000
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	698,535	0,000
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor	3,492,675	0,000
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire /desfiintare	3,492,675	0,000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	500,000	500,000
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,000	0,000
5.5	Total Capitol 5	8183,885	0,000
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,000	0,000
6.2	Proble tehnologice	0,000	0,000
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste		0,000	0,000
TOTAL CAPITOLE		0,000	0,000
Din care C+M		787,418,865	148,054,646
		698,534,980	132,721,646
		831,256,626	831,256,626

Ca urmare a notei de constatare nr. 1 prin care s-a constatat necesitatea operarii unor modificari la obiectivul „Amenajare trot. in com. Straja, jud. Suceava, de la Carciu Dimitrie(Ionascu-nr.899) pana la Carciu Ilie (Jelea-nr.943)” au rezultat ca fiind necesare executarea unor lucrari, fapt pentru care s-a emis dispozitia de santier nr. 1 aferenta acesteia, astfel:

1. Pentru a asigura o rezistenta sportiva a trotuarului in zonele prin care se face alimentarea cu marfa a depozitelor din zona „La Troaca” s-a propus utilizarea a 701mp pava cu grosime 8cm, astfel s-a renuntat la 513mp pava cu grosimea de 6cm,
2. Pentru a reconfigurarea spatului public s-a propus executia unui spatiu de joaca prevazut cu echipamente de joaca, gazon sintetic, 4 stalpi pentru a asigura iluminatul iar pentru protectie a fost construita o imprejmuire cu sipci din lemn,
3. Pentru a proteja zona pietonala din zona „La Troaca” s-a dispus utilizarea a 543ml bordura din beton cu inaltimea de 25cm, astfel s-a renuntat la 1116 ml bordura mica 10x15,
4. Pentru a asigura o captare eficienta a apelor pluviale s-a propus folosirea a 23ml rigola carosabila cu capac, 336ml teava corugata si 10 geigere cu gratar impreuna cu 10 camine de vizitare,
5. S-a propus modernizarea fantanii care capteaza izvorul cu apa potabila,
6. A fost necesara ridicarea a in cota a 69 de capace provenite de la canalizarea existenta,
7. Pentru a spori rezistenta punii pietonale au fost inlocuite materialele lemnase cu materiale metalice,

PROIECTANT

S.C. NOVA PROIECT S.R.L



ing

REFERAT DE APROBARE

privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Amplasare trotuar în comuna Straja, județul Suceava, de la Cîrciu Dimitrie (Ionașcu – nr. 899) până la Cîrciu Ilie (Jelea – nr. 943)", ca urmare a executării unor lucrări suplimentare

În baza contractului de lucrări încheiat cu UAT Comuna Straja, constructorul S.C. LODOR CONSTRUCT S.R.L. execută lucrările la obiectivul de investiții "Amplasare trotuar în comuna Straja, județul Suceava, de la Cîrciu Dimitrie (Ionașcu – nr. 899) până la Cîrciu Ilie (Jelea – nr. 943)".

Investiția a fost aprobată prin H.C.L. nr. 38/20.12.2021, prin care a fost aprobată documentația tehnico-economică – faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, la valoarea de 571.215,200 lei (cu TVA), din care C+M 470.764 lei (cu TVA).

Prin H.C.L. nr. 61/28.11.2022 s-au actualizat indicatorii tehnico-economici la valoarea de 793.885,62 lei (cu TVA), din care C+M 693.434,42 lei (cu TVA).

În urma încheierii procedurii de achiziție publică a contractului de lucrări, valoarea de finanțare a obiectivului de investiție este de 692.457,95 lei (cu TVA).

Finanțarea investiției este asigurată din bugetul local al comunei Straja.

Pe durata executării lucrărilor au intervenit unele modificări, consemnate în Nota de constatare nr. 1, urmată de Dispoziția de șantier nr. 1 și de memoriul tehnic al proiectantului, care a actualizat devizul general conform modificărilor.

S-au întocmit, de asemenea, note de renunțare (NR), respectiv, note de comandă suplimentare (NCS), conform centralizatorului financiar întocmit de constructor.

În cadrul modificărilor sunt evidențiate lucrări suplimentare, cuprinse în Dispoziția de șantier nr. 1, lucrări necesare pentru funcționalitatea, stabilitatea și siguranța de exploatare a proiectului.

Lucrările suplimentare se estimează la valoarea de 116.637,54 lei, fără TVA.

Având în vedere execuția unor lucrări suplimentare, notele de renunțare, se impune modificarea indicatorilor tehnico-economici, precum și aprobarea valorii finale a investiției care să înglobeze toate cheltuielile investiției.

Astfel, valoarea finală a investiției este de 935.473,511 lei, din care C+M 831.256,626 lei (cu TVA), conform devizului general întocmit de proiectant .C. TOTAL MAPINVENT S.R.L.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, documentațiile tehnico-economicale ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completarea bugetelor locale, precum și a celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative.

Potrivit art. 7 alin. (6) din Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economicale aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maxime ale indicatorilor tehnico-economici aprobați, este necesară refacerea corepunzătoare a documentației tehnico-economicale aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori.

Concluzionând, în baza:

- Notei de constatare nr. 1 înregistrată la Primăria comunei Straja sub nr. 2668 din 26.03.2025, însoțită de dispoziția de șantier nr. 1 și memoriul tehnic nr. 1 întocmit de proiectant S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. la proiectul nr. 3/2021 privind lucrările suplimentare necesare de executat la obiectivul de investiții;
- Centralizatorul financiar privind NR, NC și respectiv NCS;

- Devizul general al obiectivului de investiții „Amenajare trotuar în comuna Straja, județul Suceava, de la MAPINVENT S.R.L., înregistrat la Primăria comunei Straja sub nr. 4763 din 11.06.2025, care cuprinde valoarea finală a investiției, inclusiv lucrările suplimentare, se impune supunerea spre aprobare a executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții „Amenajare trotuar în comuna Straja, județul Suceava, de la Cîrciu Dimitrie (Ionașcu – nr. 899) până la Cîrciu Ilie (Jelea – nr. 943)”, precum și modificarea indicatorilor investiției la valoarea finală conform devizului general al obiectivului de investiții, după cum urmează:

- lucrări suplimentare: 116.637,54 lei, fără TVA;
- total general (cu TVA): 935.473,511 lei, din care C+M 831.256,626 lei.

Având în vedere cele sus – menționate, propun Consiliului Local dezbateră proiectului de hotărâre și aprobarea lui în forma prezentată.

